
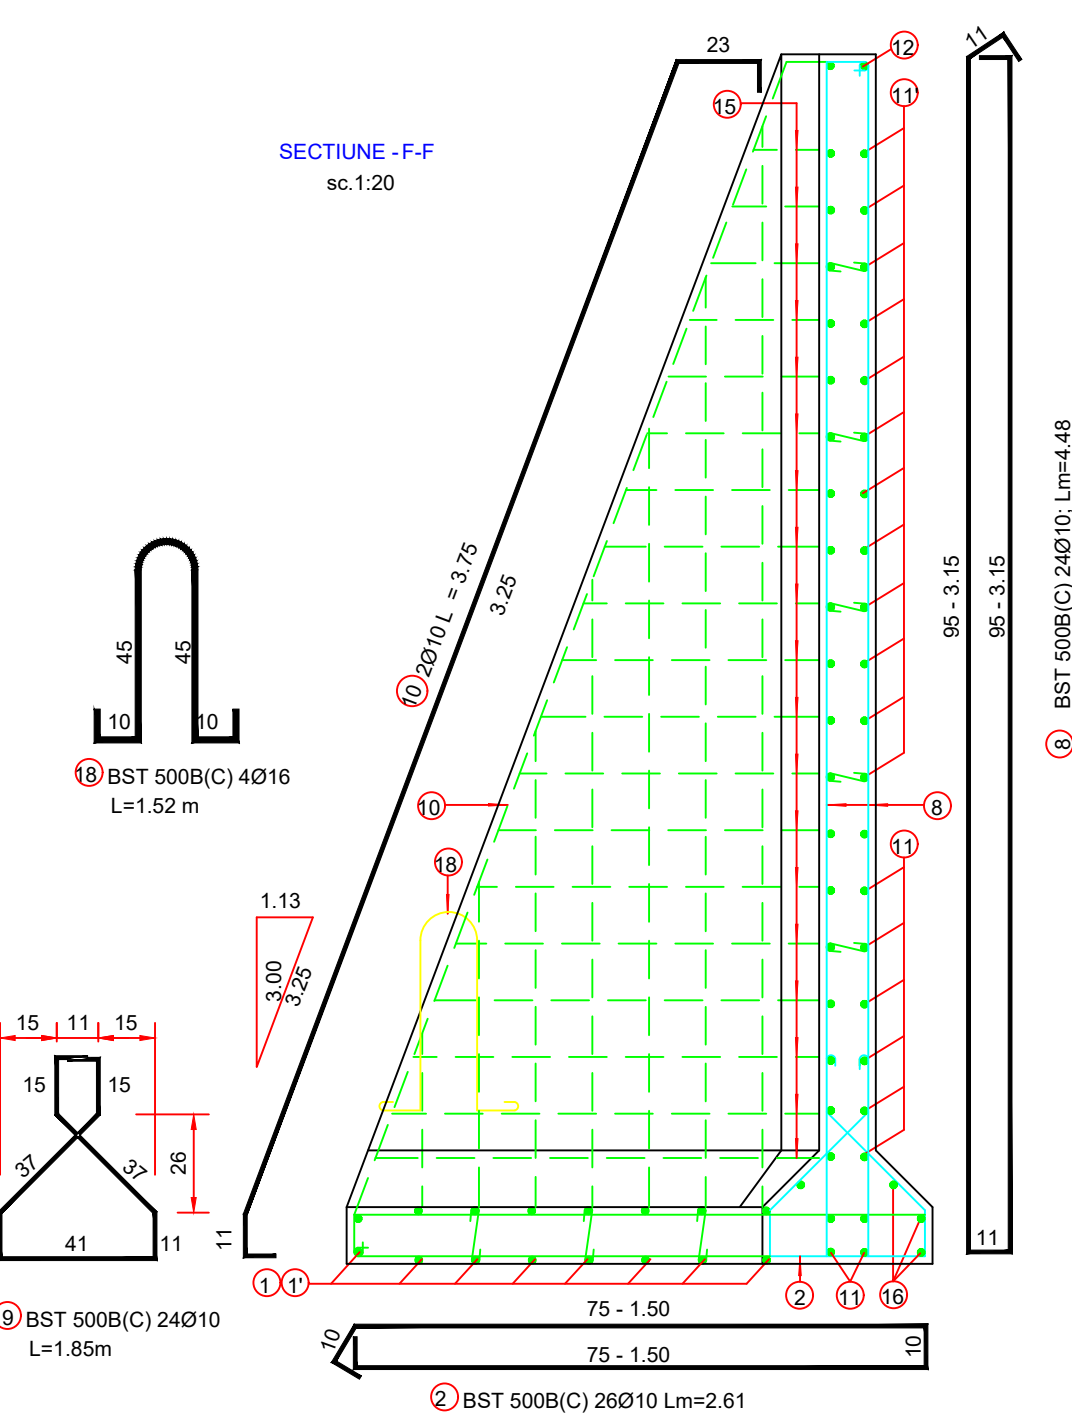


NOTA:

- Fetele interioare ale peretilor si fata superioara a placii se izoleaza pe santier cu suspensie de bitum filerizat.
- Pentru manevrare si montare se folosesc cele 4 ancore Ø16.
- Aripi se aseaza pe blocul de fundatie avand suprafata de beton nivelata pe un strat proaspat de mortar M100 de 1 cm. grosime.
- Clasa de precizie CP. 8.

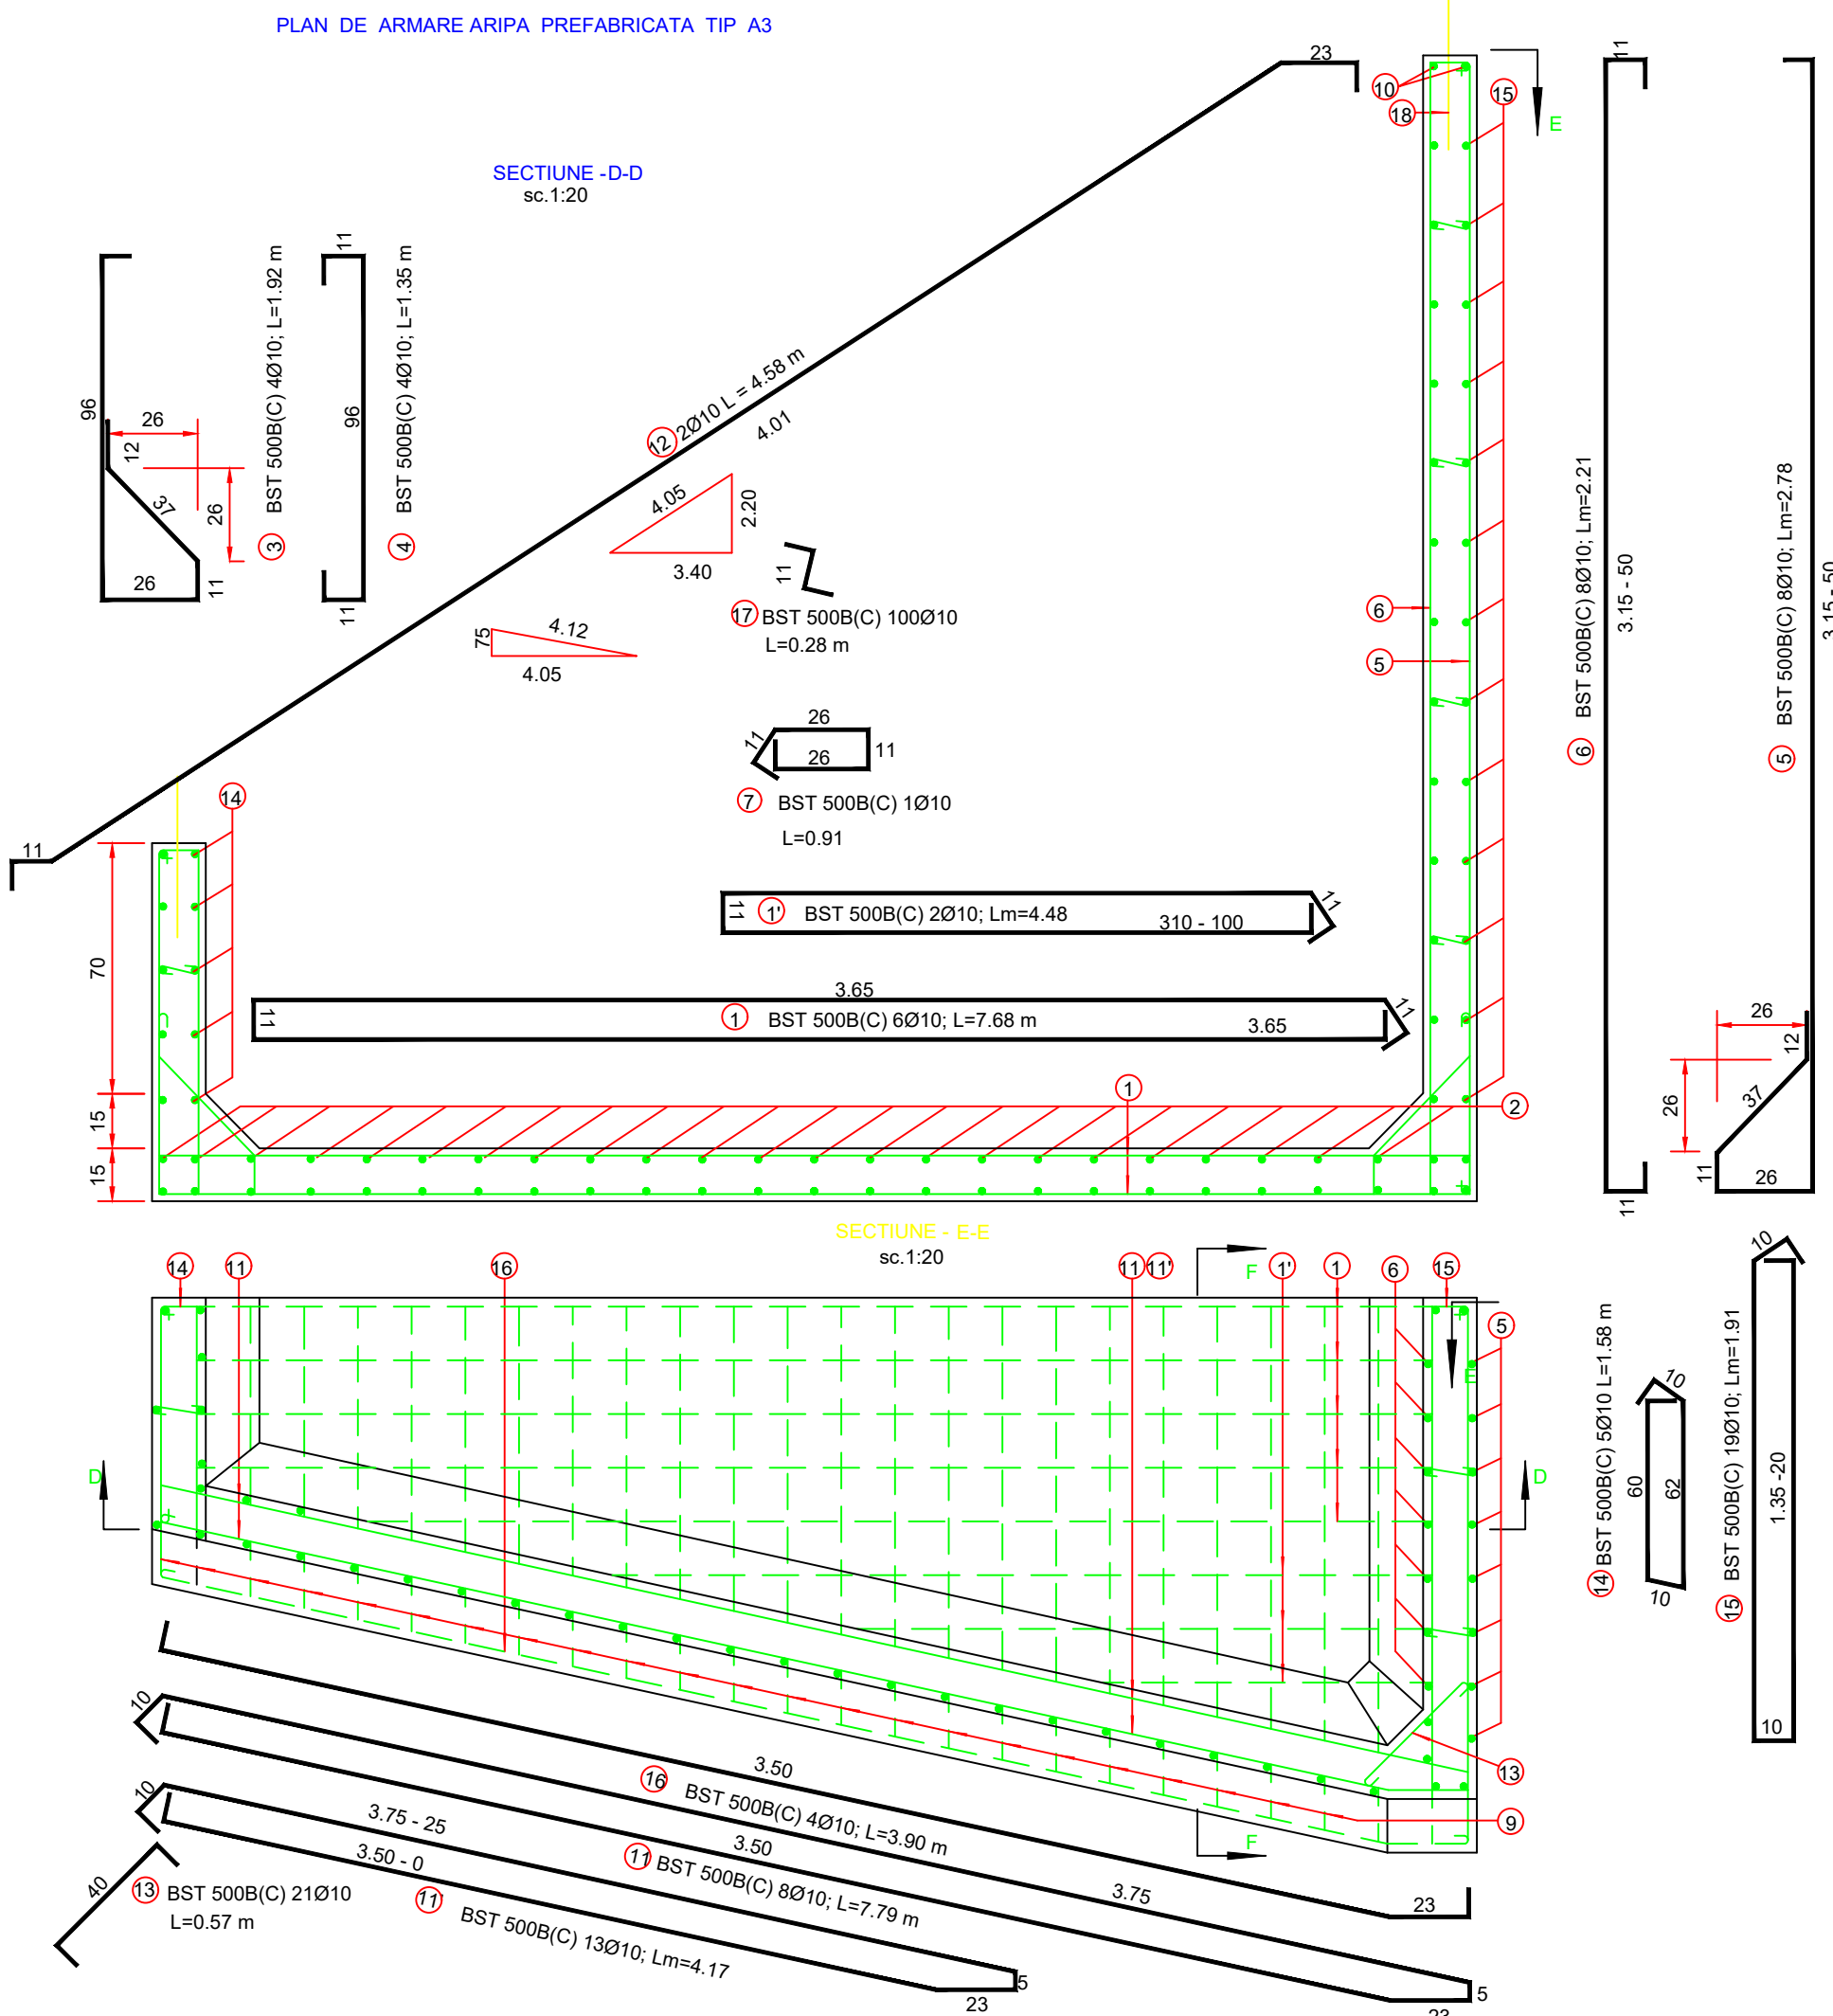

NOTA:

Grosimea minima a straturii de beton pentru acoperirea armaturilor este de 2 cm.

CARACTERISTICI ARIPIA
PREFABRICATA TIP A3

EXTRAS DE ARMATURA ARIPIA PREFABRICATA TIP A3					
MARCA	DIAMETRU	N.R. BUCATI	LUNGIME(m)/BUCATA	LUNGIMI(m)/DIAMETRU	
				BST 500B(C)	
				ø10	ø16
1	10	6	7.68	46.08	
1'	10	2	4.48	8.96	
2	10	26	2.61	67.86	
3	10	4	1.92	7.68	
4	10	4	1.35	5.4	
5	10	8	2.78	22.2	
6	10	8	2.21	17.64	
7	10	1	0.91	0.91	
8	10	24	4.48	107.52	
9	10	24	1.85	44.4	
10	10	2	3.75	7.5	
11	10	8	7.79	62.32	
11'	10	13	4.17	54.145	
12	10	2	4.58	9.16	
13	10	21	0.57	11.97	
14	10	5	1.58	7.9	
15	10	19	1.91	36.29	
16	10	4	3.9	15.6	
17	10	100	0.28	28	
18	16	4	1.52	561.535	6.08
LUNGIMI TOTALE(m)					6.08
MASA(kg)			/METRU	0.62	1.58
				/DIAMETRU	346.47
				TOTALA	356.07

Beton C30/37 2.10 mc
Otel BST 500B(C) 356.07 kg
Cofraj 27.2 mp
Greutate 5.31 t

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2007/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)
- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2002
- Raport apa/ciment (max)

C30/37
XC4+XD1+XF4
340 kg/mc
CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, IIIA-S, A-LL;
0.5



INVESTITOR	PROIECTANT GENERAL	AMPLASAMENT	DENUMIRE PROIECT PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE COACIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	FAZA PROIECT PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	Manager de Proiect Ing. Silvan Moldovan Sef Echipa Protectare Ing. Raul Cocs Inginer Proiectant Poduri Ing. Attila Takacs Inginer Proiectant Drumuri Ing. Valentin Oaida	REVIZII			DENUMIRE PLANSA DETALIU PLAN COFRAJ SI ARMARE ARIPA A3
						NR. REV.	DATA	SEM.	
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	D.P. CONSULT S.A.		NUMAR CONTRACT : 550/96/09.02.2023 NUMAR PROIECT : 556	Data : 03.2023 VERIFICATOR TEHNIC					Scara : 1:20 556-VOTM-DET-29
