


NOTA:

- Fetele interioare ale peretilor si fata superioara a placii se izoleaza pe santier cu suspensie de bitum filerizat.
- Pentru manevrare si montare se folosesc cele 4 ancore Ø16.
- Aripa se aseză pe blocul de fundație având suprafața de beton nivelată pe un strat proaspăt de mortar M100 de 1 cm. grosime.
- Clasa de precizie CP. 8.

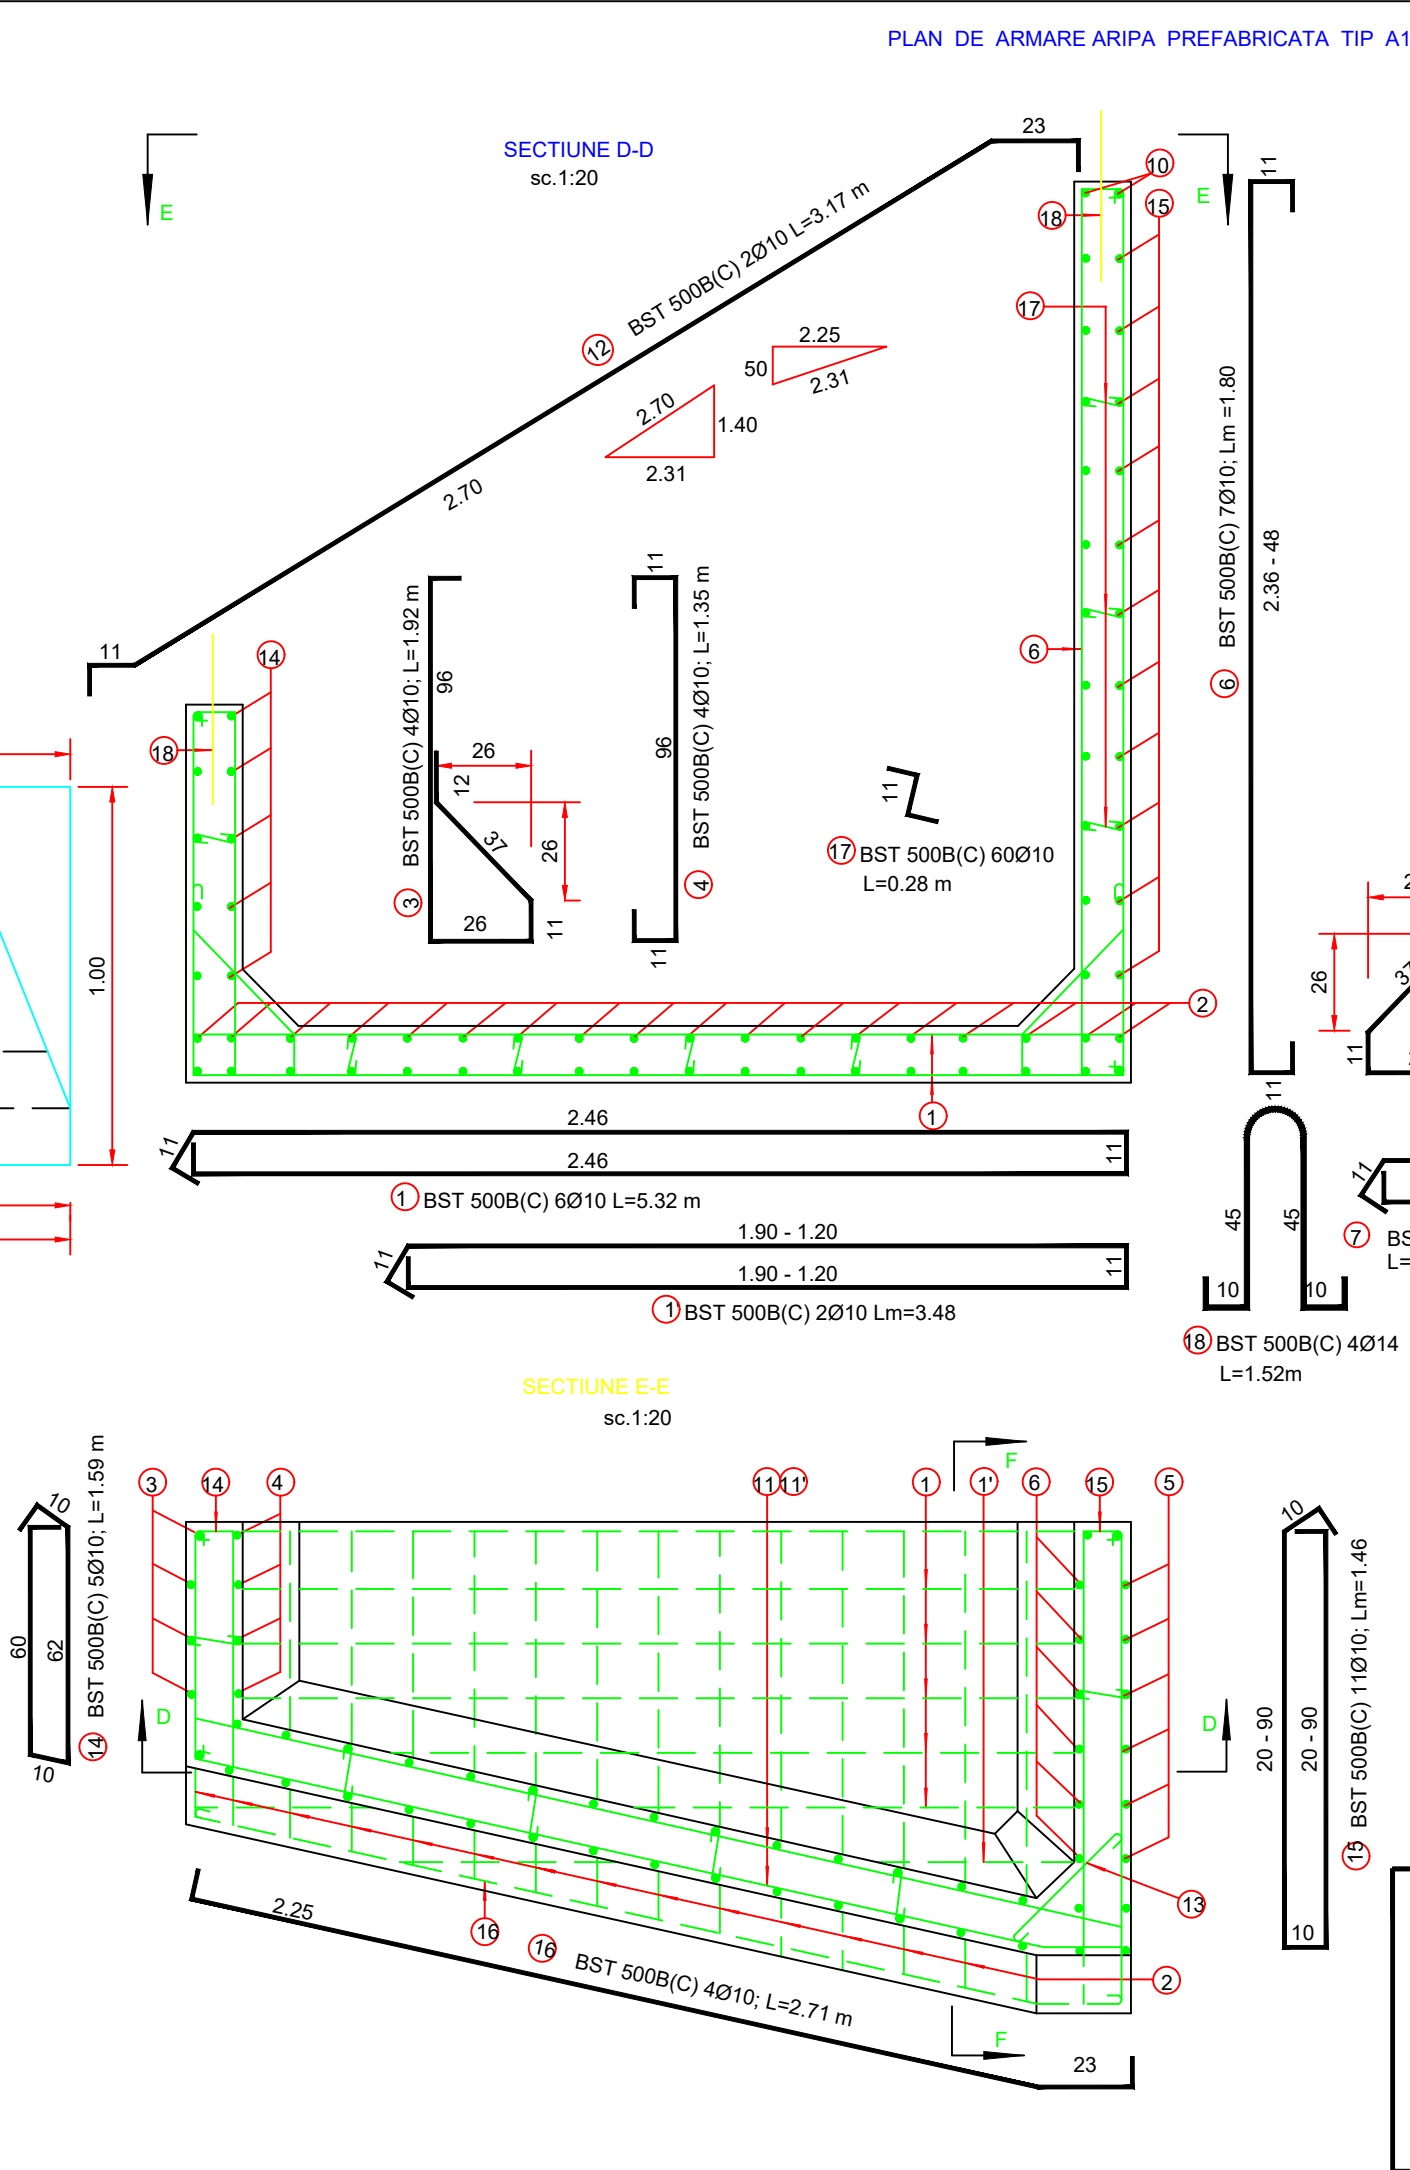

CARACTERISTICI ARIPA
PREFABRICATA TIP A1

Beton C30/37 1.38 mc
Otel BST 500B(C) 217.09 kg
Cofraj 17.3 mp
Greutate 3.53 t

EXTRAS DE ARMATURA ARIPA PREFABRICATA TIP A1					
MARCA	DIAMETRU	NR. BUCATI	LUNGIME(m)/BUCATA	LUNGIMI(m)/DIAMETRU	
				BST 500B(C)	
1	10	6	5.32	54.24	
1'	10	2	3.48	6.96	
2	10	17	2.38	40.46	
3	10	4	1.92	7.68	
4	10	4	1.35	5.4	
5	10	7	2.37	16.59	
6	10	7	1.8	12.6	
7	10	1	0.9	0.9	
8	10	13	3.3	42.9	
9	10	13	1.77	23.01	
10	10	2	2.92	5.84	
11	10	7	5.37	37.59	
11'	10	7	3.07	21.49	
12	10	2	3.17	6.34	
13	10	11	0.57	6.27	
14	10	5	1.59	7.95	
15	10	11	1.46	16.06	
16	10	4	2.71	10.84	
17	10	60	0.28	16.8	
18	14	4	1.52		6.08
LUNGIMI TOTALE(m)				339.92	6.08
MASA(kg)			/METRU	0.62	1.21
				/DIAMETRU	209.73
				TOTALA	217.09

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2007/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune
- Clasele de expunere (min)
- Dozaj minim de ciment (min)
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2002
- Raport apa/ciment (max)

C30/37
XC4+XD1+XF4
340 kg/mc
CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5;
CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
0,5



INVESTITOR	PROIECTANT GENERAL	AMPLASAMENT	DENUMIRE PROIECT PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCULIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	FAZA PROIECT PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	Manager de Proiect ing. Silvan Moldovan Sef Echipa Proiectare ing. Raul Cocis Inginer Proiectant Poduri ing. Attila Takacs Inginer Proiectant Drumuri ing. Valentin Oaida	REVIZII			DENUMIRE PLANSA DETALIU PLAN COFRAJ SI ARMARE ARIPA A1 Scara : 1:20 NUMAR PLANSA 556-VOTM-DET-27
						NR. REV.	DATA	SEMN.	
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	D P CONSULT S.A.		NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 NUMAR PROIECT : 556	Data : 03.2023 VERIFICATOR TEHNIC					
